

山城青谷駅周辺整備事業の取組について

山城青谷駅周辺整備事業の取組について、次のとおり報告します。

1. 新青谷線・山城青谷駅東西線（自由通路）・駅前広場の工事完成までの取組状況や今後のスケジュール（案）

取組項目	前回報告 (令和4年12月9日)	今回報告
① 新青谷線・山城青谷駅東西線（自由通路）・駅前広場・青谷公園の都市計画（案）説明会開催	平成30年11月21日	
② 都市計画決定告示	平成31年2月26日	
③ JR西日本との工事協定締結（自由通路・橋上駅舎）	令和元年6月	
④ 詳細設計、用地測量、補償調査、用地買収	令和元年6月～	
⑤ 事業説明会（事業概要、今後の工程）	令和元年7月25日	
⑥ 埋蔵文化財調査、新青谷線・駅前広場工事着手	令和2年2月～	
⑦ 事業説明会（駅舎工事の概要、今後の工程、駅デザイン）	令和2年8月、9月 市ホームページ等による事業説明に代替	
⑧ 自由通路・橋上駅舎工事着手	令和3年2月～	
⑨ 自由通路・橋上駅舎、新青谷線、駅前広場供用開始	令和5年度上期 新青谷線の一部 駅前広場 (自由通路・橋上駅舎は令和4年7月23日に供用開始) 令和5年度末 新青谷線の全線	令和5年12月 新青谷線の一部 令和6年度上期 新青谷線の全線 西側駅前広場 (東側駅前広場は 令和5年4月3日に供用開始)

※供用時期の変更理由

事業用地の一部について、用地買収等の交渉に時間を要していることから、工程の精査により供用時期（目標）の見直しを行ったもの。

2. 中村道踏切改良事業の工事完成までの取組状況や今後のスケジュール（案）

取組項目	前回報告 (令和4年12月9日)	今回報告
① JR西日本との工事協定締結	令和元年6月	
② 関係機関協議・詳細設計等	令和元年度～	
③ 事業説明会（事業概要、今後の工程）	令和2年8月、9月 広報じょうよう、市ホームページ等による 事業説明に代替	
④ 用地測量、補償調査	令和2年9月頃～	
⑤ 用地買収	令和3年度～	
⑥ JR踏切工事着手	令和4年11月～	
⑦ 歩道整備工事着手	令和5年度～	
⑧ 供用開始	令和5年度末	令和6年度上期


※供用時期の変更理由

事業用地の一部について、用地買収等の交渉に時間を要しており、工事着手に遅れが生じていることから、工程の精査により供用時期（目標）の見直しを行ったもの。

3. 添付資料

山城青谷駅周辺整備事業計画図

山城青谷駅周辺整備事業計画図

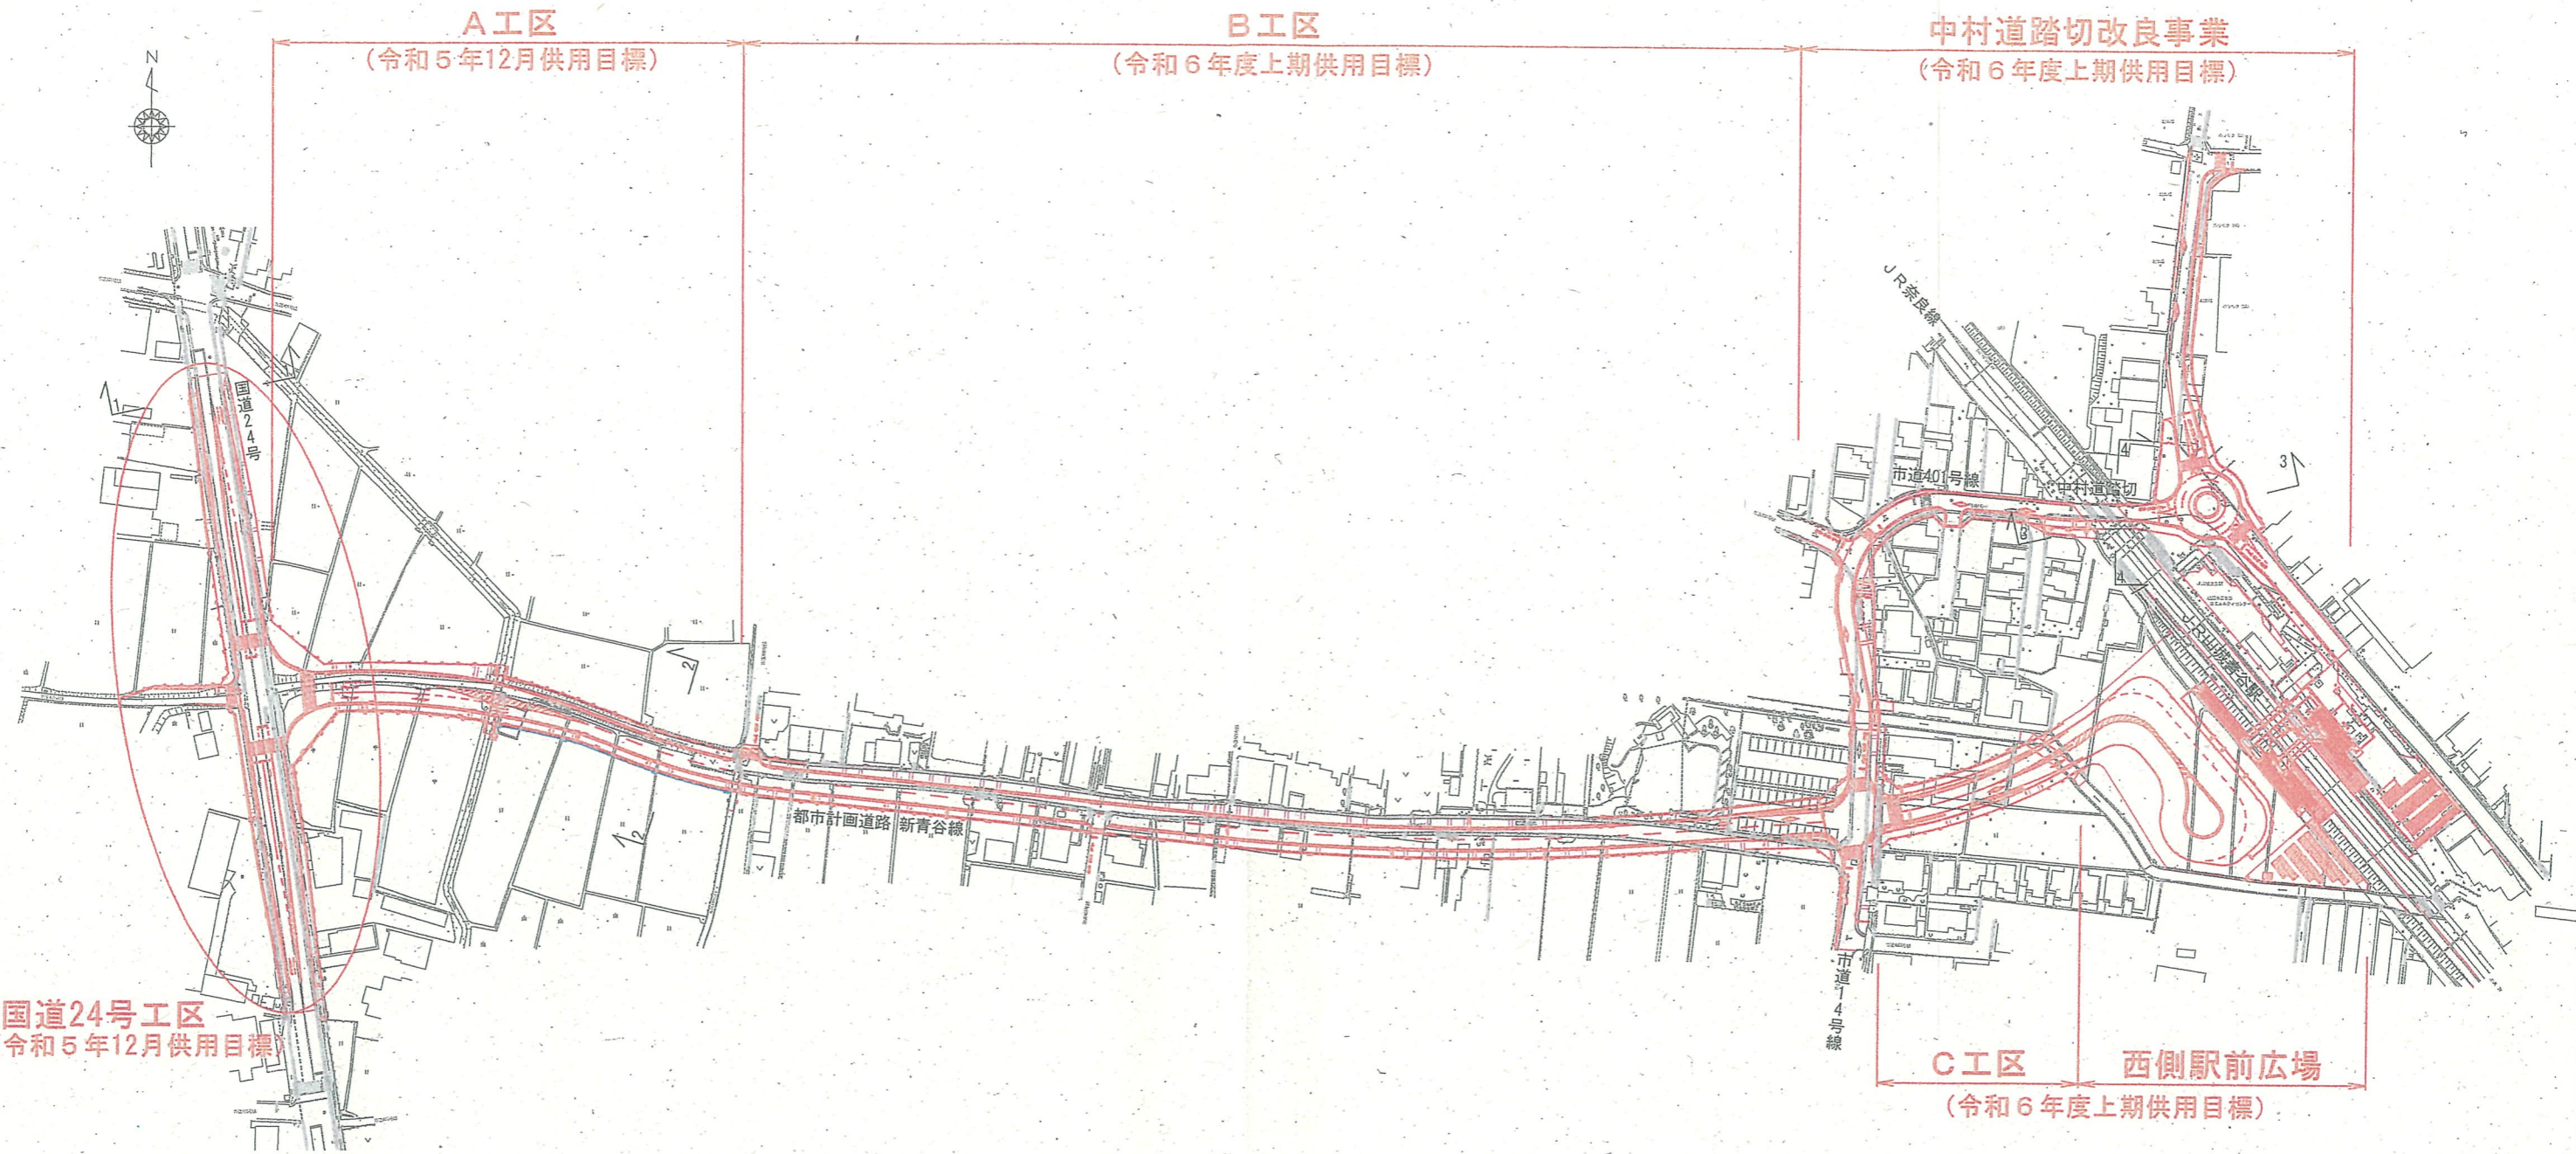

国道24号工区
(令和5年12月供用目標)

A工区
(令和5年12月供用目標)

B工区
(令和6年度上期供用目標)

中村道踏切改良事業
(令和6年度上期供用目標)

C工区
西側駅前広場
(令和6年度上期供用目標)

国道24号 1-1

13000					
2500	8000				2500
歩道	750	3250	3250	750	歩道
	路肩	車線	車線	路肩	

都市計画道路 新青谷線 2-2

12000				
2500	7000			2500
歩道	500	3000	3000	歩道
	路肩	車線	車線	路肩

中村道踏切改良事業
円形交差点部 3-3

22000						
19500						2500
4000	1500	7000		1500	4000	歩道
環道	エプロン	500	中央島	500	エプロン	環道
	路肩			路肩		路肩

踏切部 4-4

7500			
5000			2500
500	4000	500	歩道
路肩	車線	路肩	

※エプロン
環道のみでは通行困難な車両が通行の用に供しても良い部分をいう。
