

山城青谷駅周辺整備事業の取組について

山城青谷駅周辺整備事業の取組について、次のとおり報告します。

1. 新青谷線・山城青谷駅東西線（自由通路）・駅前広場の取組状況

①平成30年11月21日	新青谷線・山城青谷駅東西線（自由通路）・駅前広場・青谷公園の都市計画（案）説明会開催
②平成31年2月26日	都市計画決定告示
③令和元年6月	J R 西日本との工事協定締結（自由通路・橋上駅舎）
④令和元年6月～	詳細設計、用地測量、補償調査、用地買収
⑤令和元年7月25日	事業説明会（事業概要、今後の工程）
⑥令和2年2月～	埋蔵文化財調査、新青谷線・駅前広場工事着手
⑦令和2年8月、9月	事業説明会（駅舎工事の概要、今後の工程、駅デザイン） （市ホームページ等による事業説明に代替）
⑧令和3年2月～	自由通路・橋上駅舎工事着手
⑨令和4年7月23日	自由通路・橋上駅舎の供用開始
⑩令和5年4月3日	東側駅前広場の供用開始
⑪令和5年9月14日 （令和5年第3回定例会）	新青谷線（一部）の供用時期（令和5年12月）、新青谷線の 全線及び西側駅前広場の供用時期（令和6年度上期）を報告
⑫令和5年12月19日	新青谷線（一部）の供用開始

2. 中村道踏切改良事業の取組状況

①令和元年6月	J R 西日本との工事協定締結
②令和元年度～	関係機関協議・詳細設計等
③令和2年8月、9月	事業説明会（事業概要、今後の工程） （市ホームページ等による事業説明に代替）
④令和2年9月～	用地測量、補償調査
⑤令和3年度～	用地買収
⑥令和4年11月～	J R 踏切工事着手
⑦令和5年度～	歩道整備工事着手
⑧令和5年9月14日 （令和5年第3回定例会）	供用時期（令和6年度上期）を報告
⑨令和6年度～	車道整備工事着手


3. 供用時期の見直し

事業用地の一部について、用地買収等の交渉に時間を要しているため、供用時期は用地取得の目途が立った段階において、再度、工程を精査の上、改めてお知らせします。

4. 添付資料

山城青谷駅周辺整備事業計画図

山城青谷駅周辺整備事業計画図

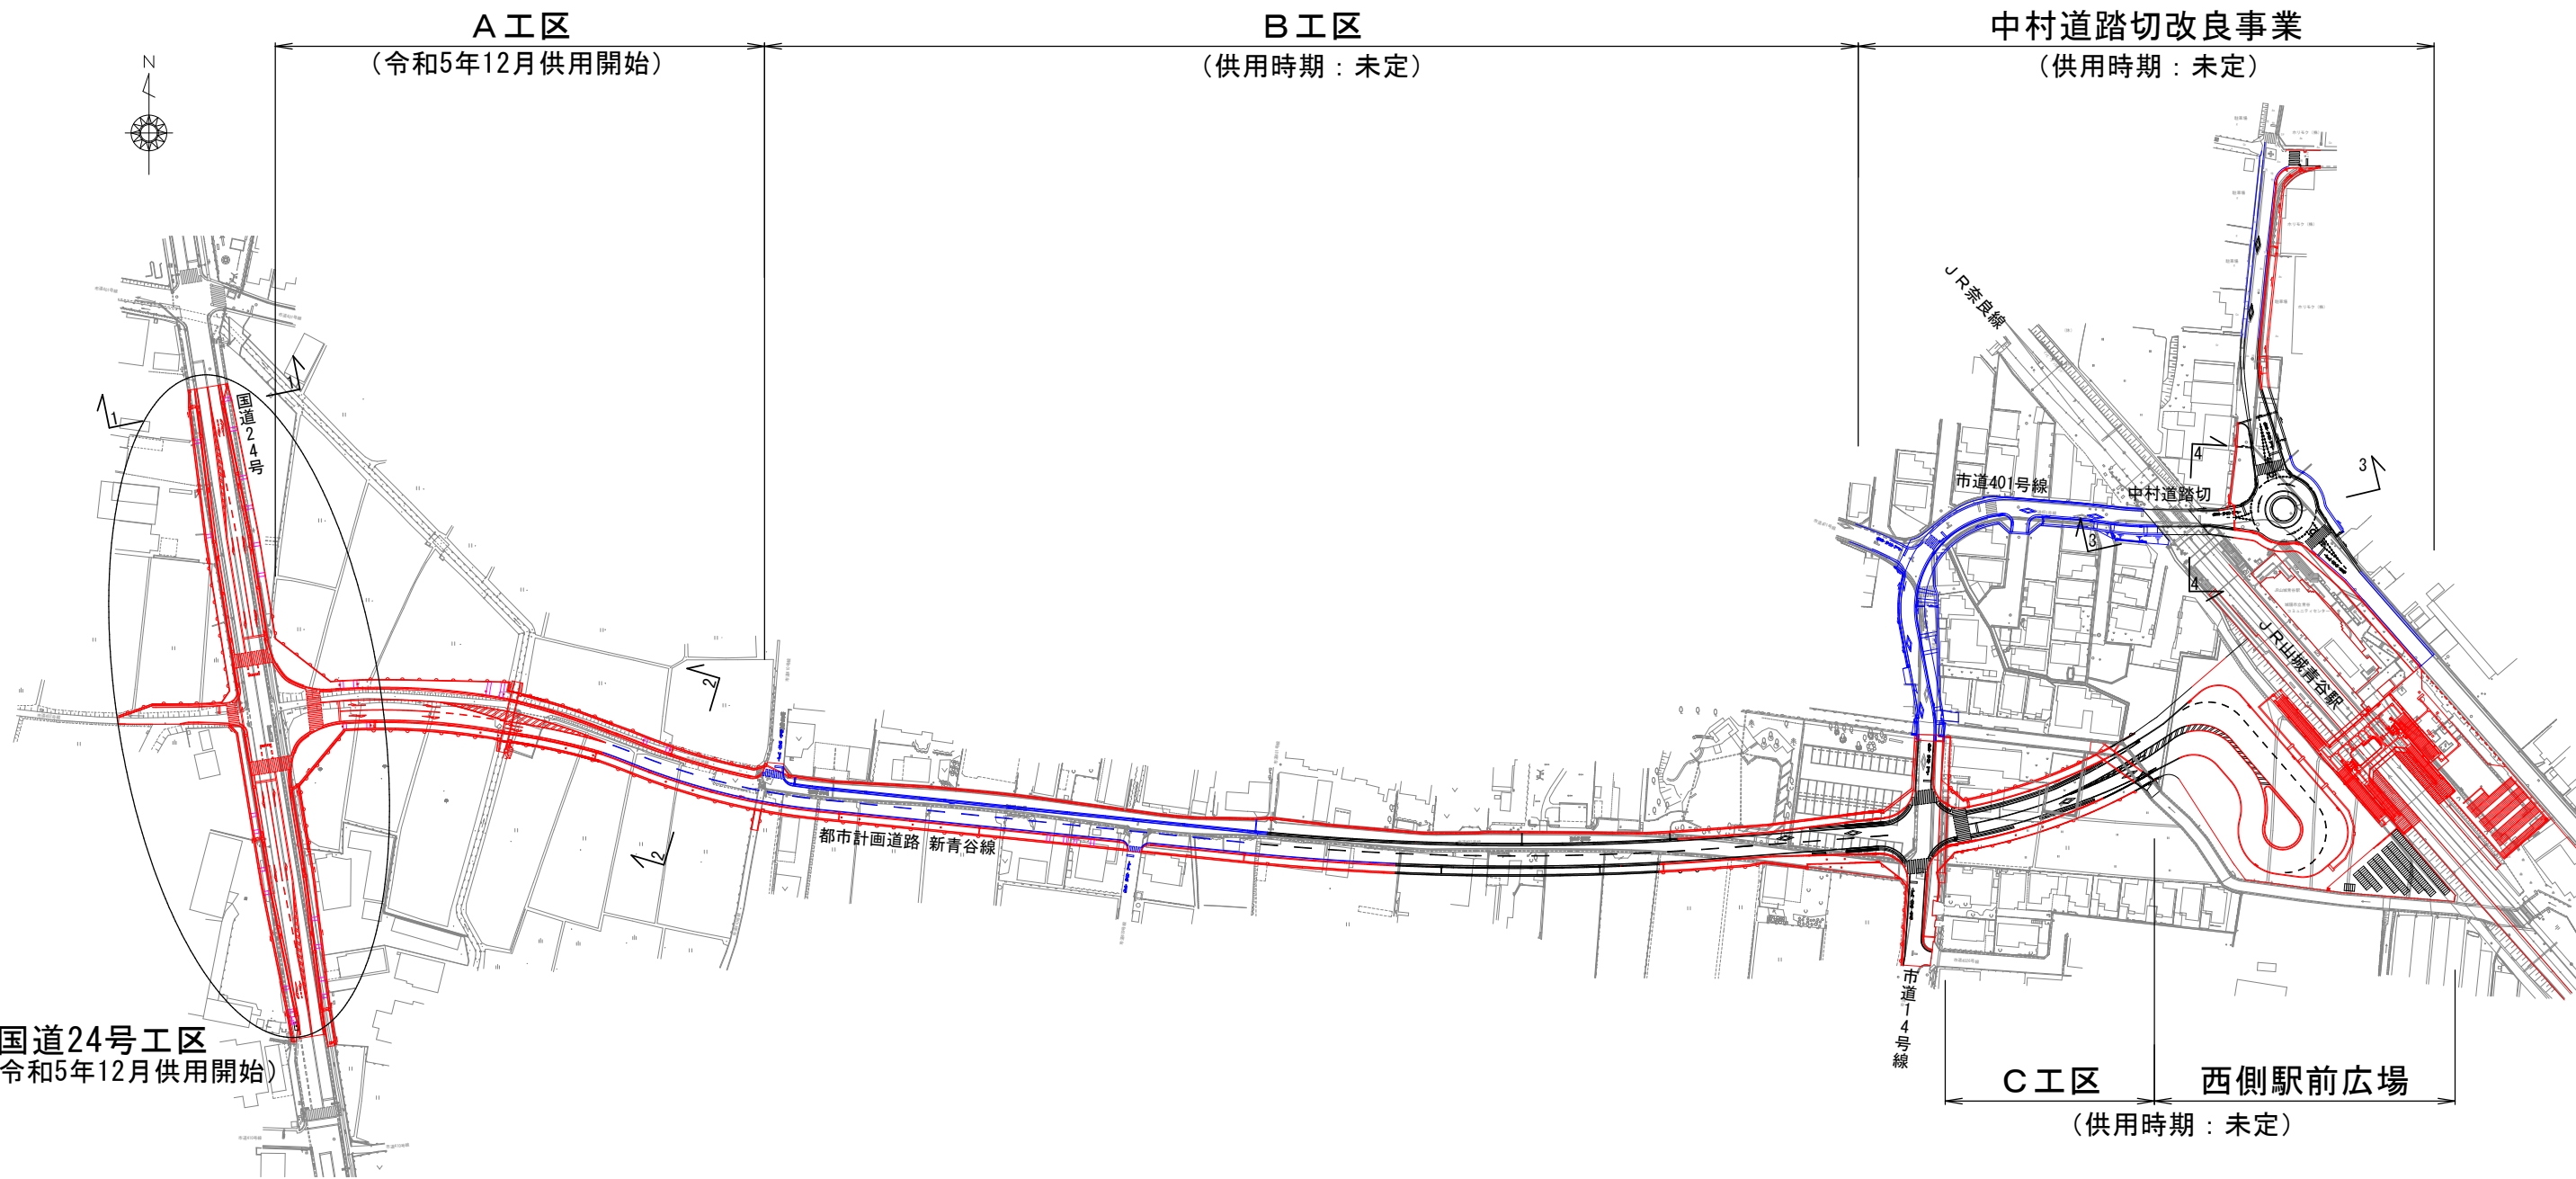

国道24号工区
(令和5年12月供用開始)

国道24号 1-1

13000						
2500	8000				2500	
歩道	750	3250	3250	750	歩道	
	路肩	車線	車線	路肩		

都市計画道路 新青谷線 2-2

12000					
2500	7000				2500
歩道	500	3000	3000	500	歩道
	路肩	車線	車線	路肩	

円形交差点部 3-3

22000						
19500						2500
4000	1500	7000	1500	4000	500	歩道
環道	エプロン	中央島	エプロン	環道	路肩	

※エプロン
環道のみでは通行困難な車両が通行の用に供しても良い部分をいう。

踏切部 4-4

7500			
500	4000	500	2500
路肩	車線	路肩	歩道

- 凡例
- 整備済み (Red line)
 - R6年度発注済み (Blue line)
 - 未整備 (残工事) (Black line)
